

Brakel

Dorpskernvernieuwing Nederbrakel (2016-2018).

Aangepaste planning februari 2017

Als gevolg van het archeologisch onderzoek aan de voorzijde van de kerk – dat een stuk uitgebreider was dan voorzien – werd de planning aangepast.

In deze presentatie is de nieuwe planning opgenomen.

Alle hierna voorgestelde informatie is gebaseerd op de meest actuele gegevens.

Wijzigingen zijn steeds mogelijk; bijvoorbeeld op basis van de weersomstandigheden en het archeologisch onderzoek.

Contactgegevens

Persyn NV
Blokellestraat 113a
8550 Zwevegem

Werfleider:

Marc Vanneste
Marc.vanneste@persyn.be
GSM: 0497 475 957



Toezichter voor gemeente Brakel

Tom Callant

GSM: 0486 64 29 76

dorpskernvernieuwing@brakel.be

Farys (riolering)

Lieven Sandrap

GSM: 0474 13 87 29

Lieven.sandrap@farys.be

Totale werkzone



Fasering – overzicht deelfasen



Fase 2 – riolerings- en wegeniswerken Serpentestraat

Wat: Rioleringswerken en wegeniswerken (klinkers)

Termijn: Serpentestraat afgewerkt 15 maart 2017

Impact: Geen wagens op het Marktpllein

Wekelijkse markt in Hoog- en Neerstraat en Vierschaar

Parkeren op Tirse – Vierschaar

Doorgaand verkeer Neerstraat en Hoogstraat

Fase 2 – riolerings en wegeniswerken Marktpllein



Fase 2 – riolerings en wegeniswerken Marktpllein

Wat: Rioleringswerken en plaatsen klinkers

Termijn: Marktpllein afgewerkt 15 maart 2017 (niet zijde kerk en Belfius)

Impact: Geen wagens op het Marktpllein

Wekelijkse markt in Hoog- en Neerstraat en Vierschaar

Parkeren op Tirse – Vierschaar

Doorgaand verkeer Neerstraat en Hoogstraat

Fase 3 – wegeniswerken voorzijde kerk



Fase 3 – wegeniswerken voorzijde kerk

Wat: Wegeniswerken voorzijde kerk

Termijn: Voetpaden (kant strijkwinkel) voorzien van klinkers tegen 15 maart

Weg aangelegd in minder hinder steenslag

Impact: Geen wagens op het Marktplain

Wekelijkse markt in Hoog- en Neerstraat en Vierschaar

Parkeren op Tirse – Vierschaar

Doorgaand verkeer Neerstraat en Hoogstraat

Fase 4 – archeologie en rioleringswerken Marktpllein (zijde Belfius)



Fase 4 – rioleringswerken Marktpllein (kant Belfius)

Timing: Archeologisch onderzoek uitgevoerd 15 april.

Nadien worden er nog geen klinkers geplaatst, omdat nog zwaar verkeer nodig is voor aanleg waterpartij langs kerk.

Fase 4a – Riolerings- en wegeniswerken Belfius → bib



Fase 4a - Wegeniswerken Belfius → bib

Timing: start eerste helft mei 2017

Fase 4b – Riolerings en wegeniswerken Belfius → Neerstraat



Fase 4b – Riolerings- en wegeniswerken Belfius → bib

Timing: Start tweede helft april (in functie van einde archeologie)

Fase 5 – Aansluiting riolering ter hoogte van Strijkwinkel i.f.v. Neerstraat



Fase 5 – aansluiting riolering ter hoogte van strijkwinkel Samenvatting

Wat: Rioleringswerken

Termijn: week van 17 april


Impact: Geen wagens op het Marktplain

Wekelijkse markt in Hoog- en Neerstraat

Parkeren op Tirse – Vierschaar

Geen doorgaand verkeer Neerstraat en Hoogstraat

Fase 5 – Riolerings- en wegeniswerken tussen Gauwstraat en Vierschaar

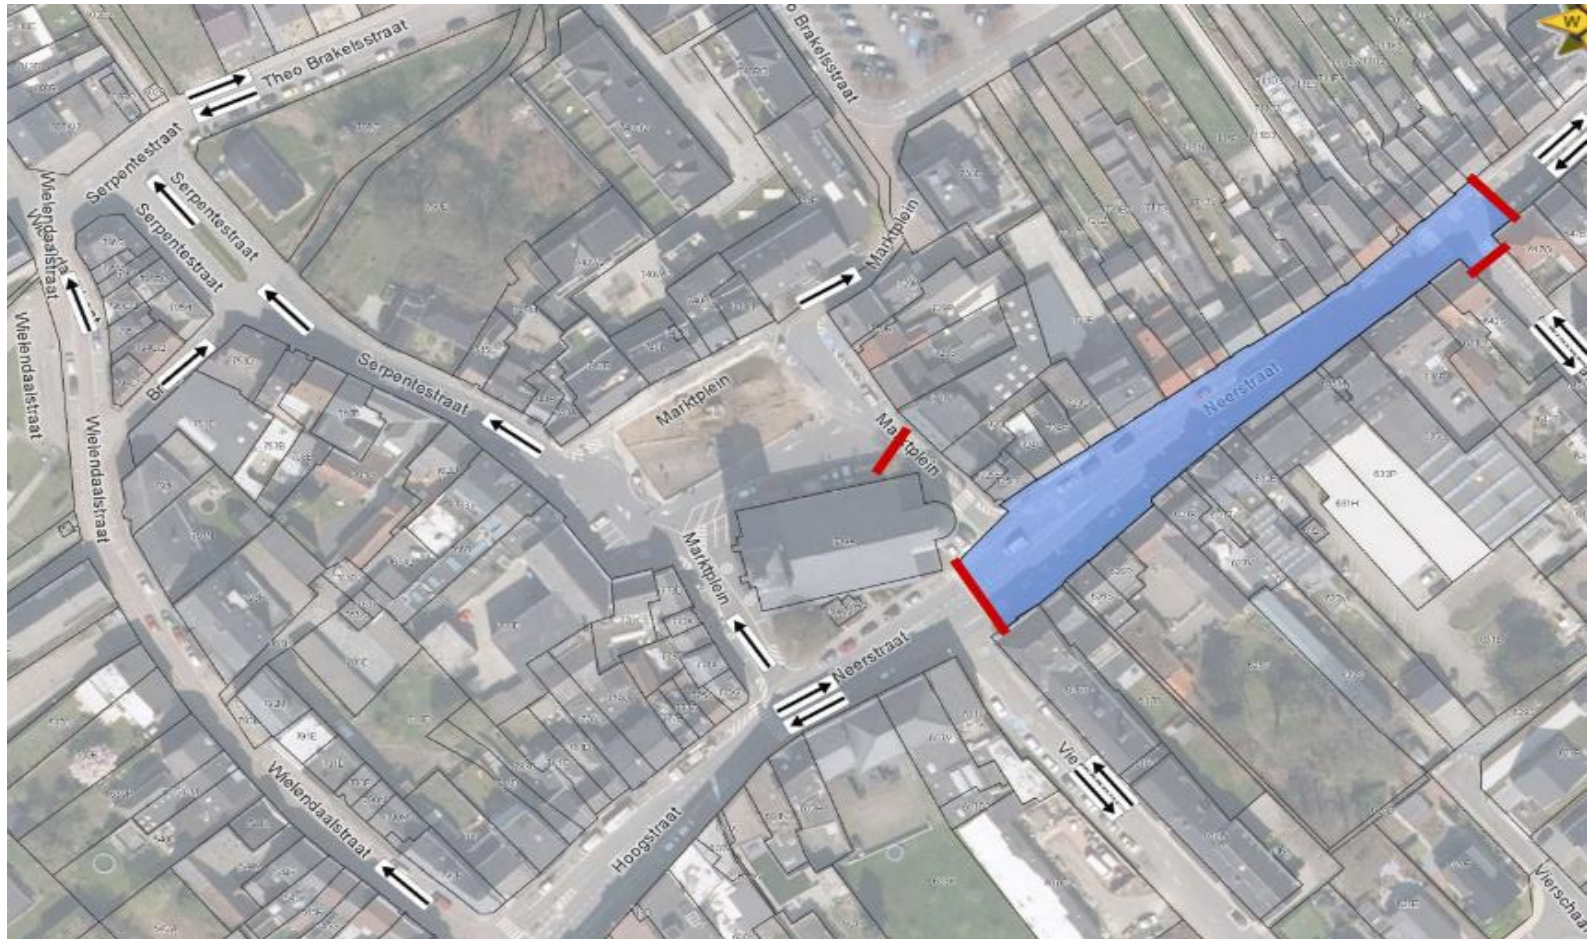

Fase 5 – Rioleringswerken en wegeniswerken tussen Gauwstraat en Vierchaar

Timing: Start tweede helft mei tot bouwverlof

Impact: Wekelijkse markt nog te bepalen

Geen doorgaand verkeer Neerstraat en Hoogstraat tot einder der werken aan Stationsstraat.

Bij start bouwverlof minder hinder steenslag in weg

Voetpaden afgewerkt (o.v.)

Lokaal verkeer op het Marktpluin toegelaten.

Ruwe inschatting vervolg der werken na bouwverlof (onder voorbehoud)

Vierschaar tot strijkwinkel: vanaf september

Strijkwinkel tot stationsstraat: vanaf oktober

aanleg klinkers in weg
voorzijde kerk

Impact: Wekelijkse markt nog te bepalen.

Geen doorgaand verkeer tot einde der werken.
